

DEMO OFFLINE

Behind the Scenes of Data Center Project

Demo 1: Satu minggu planner di Obsidian · Demo 2: Obsidian + Claude

Pakai file ini kalau tool live gagal. Setiap halaman menunjukkan satu langkah demo beserta yang dikatakan.
Gambar Obsidian adalah reproduksi dari file vault; gambar AI adalah rekaman jawaban Claude dari vault.
Pindah dengan tenang: "Ini jalur yang tadinya mau saya klik."

DEMO LANGSUNG

Demo 1 — Satu Minggu Planner di Obsidian

Tangkap temuan site walk

Planning-Knowledge-Demo

Site Walk - Week 14

FILES

▶ 00 Beranda

▶ 01 Planning & Scheduling

▶ 02 Data Center

▶ 03 Project Controls

▶ 04 Project Alpha

▶ 05 Lessons Learned

▶ 06 Referensi

▶ 07 Template

▶ 08 AI Workspace

▼ 09 Inbox

Inbox

Site Walk - Week 14

type: site-note · domain: project-alpha

Site Walk - Week 14

Data proyek fiktif — dicatat langsung saat demo.

Temuan di site:

Rigging route ke Area A terhalang scaffold facade yang dipasang melintang di loading bay; lifting permit LP-07 untuk rigging switchboard dan UPS masih pending.

Berdampak pada: [Electrical Equipment Installation - Area A \(A-3030\)](#)

Constraint: C-003 · Access · PIC: Main Contractor Site Manager

Yang Ingin Saya Ingat

Cek access dan permit di lookahead, bukan di hari start → [Cek Readiness Sebelum Mulai](#)

Catat sebagai constraint yang punya PIC dan tanggal required-by → [Constraints](#)

BACKLINKS · LINKED MENTIONS 0

Reproduksi cadangan dari file vault demo — boleh diganti screenshot asli saat rehearsal.

YANG SAYA KATAKAN

Misalnya pagi ini saya site walk dan rigging route ke Area A masih tertutup. Daripada hilang di chat atau di kepala, saya catat sebagai note — dan langsung saya link ke activity-nya.

KALAU LIVE GAGAL

Vault belum pernah dibuka di Obsidian: Open folder as vault, lalu klik lagi. Jika tetap gagal, tampilkan Offline-Demo.pdf halaman Capture.

Semua contoh project dan data di sesi ini fiktif dan dibuat untuk demonstrasi.

3

Buka activity dan backlinks

Planning-Knowledge-Demo

Electrical Equipment Installation - Area A

FILES

► 00 Beranda

► 01 Planning & Scheduling

► 02 Data Center

► 03 Project Controls

▼ 04 Project Alpha

Area A - LV Electrical Room

Constraint Register

Decision Log

Electrical Equipment Installation - A...

Gambaran Umum Project Alpha

Issue Log

Notulen Rapat Koordinasi Minggu...

Project Alpha Lessons Learned

Project Alpha Schedule

Weekly Planning - Week 14

► 05 Lessons Learned

► 06 Referensi

► 07 Template

► 08 AI Workspace

► 09 Inbox

type: project-view · domain: project-alpha

Electrical Equipment Installation - Area A

Apa yang Membuatnya Bisa Dimulai — Readiness Check

Kesimpulan: NOT READY — 4 dari 5 prerequisite yang tercatat sudah ready.

Prerequisite	Kondisi	Constraint	Bukti / Deskripsi
Drawing	✅ Ready	C-004	Shop drawing LV switchboard dan UPS sudah approved (A-1020).
Material	✅ Ready	C-005	LV switchboard dan UPS sudah delivery dan lolos receiving inspection (A-2030) termasuk penggantian pintu panel UPS yang rusak.
Access	❌ NOT READY	C-003	Rigging route ke Area A terhalang scaffold facade yang dipasang melintang di loading bay; lifting permit LP-07 untuk rigging switchboard dan UPS masih pending.
Predecessor	✅ Ready	C-007	Finishing ruangan (A-3010) dan cable containment (A-3020) di Area A sudah selesai.
Manpower	✅ Ready	C-006	Crew instalasi elektrik dan crew rigging sudah mobilisasi untuk Area A.
Inspection	Belum ada catatan	—	—
Interface	Belum ada catatan	—	—

Predecessor

ID	Activity	Hubungan	Status
A-1020	Shop Drawing Approval — LV Switchboards & UPS	FS	Complete
A-2030	Delivery & Receiving Inspection — LV Switchboards & UPS	FS	Complete
A-3020	Cable Containment Installation — Area A	FS	Complete

Successor

ID	Activity	Hubungan	Total Float (hk)
A-3040	Busway & LV Cable Pulling — Area A to Data Hall 1	SS+6	0 (critical)

BACKLINKS · LINKED MENTIONS 19

Site Walk - Week 14

Berdampak pada: Electrical Equipment Installation - Area A (A-3030)

Beranda Pengetahuan Planning

Activity utama: Electrical Equipment Installation - Area A di Area A - LV Electrical Room

Constraints

Untuk A-3030, jalur rigging terhalang scaffold façade dan izin lifting masih pending. Di atas kertas activity-nya tampak

Critical Path

Di project fiktif ini, A-3030 berada di critical path electrical menuju energization, commissioning dan Integrated Syste

Dasar-Dasar Planning

Di Project Alpha Schedule (fiktif), instalasi electrical Area A terlihat baik di model — logic, predecessor dan duration

Definisi Activity

Activity fiktif A-3030 bernama "Electrical Equipment Installation — Area A (LV Switchboards & UPS)": pekerjaan, scope da

Construction Completion

Di Project Alpha, setting equipment di Area A (Electrical Equipment Installation - Area A, A-3030) diikuti busway dan ca

Sistem Elektrikal

Di Project Alpha, LV switchboard dan UPS di Area A - LV Electrical Room menjadi awal rantai. Electrical Equipment Instal

Pengukuran Progress

Untuk Electrical Equipment Installation - Area A (A-3030) di Project Alpha yang fiktif, pembagian rules of credit sepert

Reproduksi cadangan dari file vault demo — boleh diganti screenshot asli saat rehearsal.

YANG SAYA KATAKAN

Ini activity yang tadi ada di slide. Readiness-nya kelihatan. Dan di kanan, Obsidian otomatis menunjukkan semua catatan yang menyebut activity ini — termasuk note yang baru saya tulis tiga puluh detik lalu.

KALAU LIVE GAGAL

Ctrl + P, ketik Backlinks, pilih 'Backlinks: Open backlinks'.

Semua contoh project dan data di sesi ini fiktif dan dibuat untuk demonstrasi.

4

Buka lesson yang bisa dipakai ulang

Planning-Knowledge-Demo

Cek Readiness Sebelum Mulai

FILES

► 00 Beranda

► 01 Planning & Scheduling

► 02 Data Center

► 03 Project Controls

► 04 Project Alpha

▼ 05 Lessons Learned

Catat Lesson Selagi Masih Segar

Cek Readiness Sebelum Mulai

Lead Time Ada di Luar Lookahead

Lessons Learned MOC

Pantau Float, Bukan Hanya Tanggal

Schedule Paling Sering Pecah di Int...

Terpasang Belum Tentu Commissio...

► 06 Referensi

► 07 Template

► 08 AI Workspace

► 09 Inbox

type: lesson · domain: planning · status: evergreen

Cek Readiness Sebelum Mulai

Pelajarannya

Tanggal di schedule menunjukkan kapan activity *seharusnya* mulai. Tanggal itu tidak menunjukkan apakah activity *bisa* mulai. Sebelum melepas pekerjaan, saya mengecek setiap prerequisite satu per satu:

Prerequisite	Pertanyaan saya
Gambar	Apakah revisi yang sudah approved ada di site dan dipegang crew?
Material	Apakah sudah dikirim, diinspeksi, dan bisa dijangkau — bukan sekadar "sudah datang"?
Akses	Bisakah orang dan alat benar-benar mencapai lokasi kerja? Apakah permit sudah approved?
Predecessor	Apakah pekerjaan sebelumnya benar-benar selesai, bukan "hampir"?
Manpower	Apakah crew yang tepat sudah dikonfirmasi untuk hari yang tepat?
Inspeksi	Apakah hold point dan witness sudah dijadwalkan?
Interface	Apakah pihak lain sudah menyerahkan apa yang kita butuhkan?

Kalau empat dari lima prerequisite sudah ready, activity itu belum ready. Readiness adalah logika AND, bukan rata-rata.

Kenapa Berlaku di Project Lain

- Start yang baru sebagian ready biasanya berubah jadi activity yang jalan-berhenti: double handling, crew menganggur, dan produktivitas turun.
- Mulai "supaya kelihatan ada progress" bisa menyembunyikan constraint yang sebenarnya sampai constraint itu mengenai critical path.
- Waktu termurah untuk menghilangkan constraint adalah beberapa minggu sebelum tanggal start — dan itulah fungsi [Lookahead Planning](#).

Asal Pelajaran Ini

Di Project Alpha yang fiktif, instalasi equipment Area A sudah punya gambar approved, equipment sudah dikirim, crew sudah mobilisasi. dan predecessor sudah selesai — tapi ialur riacina tertutup dan liftina permit masih

BACKLINKS · LINKED MENTIONS 18

Beranda Pengetahuan Planning

Cara Kerja Vault Ini

Informasi vs Knowledge

Constraints

Lookahead Planning

Schedule Recovery

Commissioning Readiness

Integrated Systems Testing

Area A - LV Electrical Room

Decision Log

Electrical Equipment Installation - Area A

Project Alpha Lessons Learned

Reproduksi cadangan dari file vault demo — boleh diganti screenshot asli saat rehearsal.

YANG SAYA KATAKAN

Ini bukan data project. Ini pelajaran yang saya tulis dengan bahasa saya sendiri. Di project berikutnya saya tidak mulai dari nol.

KALAU LIVE GAGAL

Ctrl + O, ketik Cek Readiness Sebelum Mulai, Enter.

Semua contoh project dan data di sesi ini fiktif dan dibuat untuk demonstrasi.

5

Cari lagi dengan satu kata

Planning-Knowledge-Demo

Electrical Equipment Installation - Area A

SEARCH

rigging

14 RESULTS

Area A - LV Electrical Room

I-001 Rigging route ke Area A terhalang High Open

Area A kecil tapi critical: di sinilah permanent power untuk Data Hall 1 berawal. Ruangan seperti ini mengumpu

Cek Readiness Sebelum Mulai

Di Project Alpha yang fiktif, instalasi equipment Area A sudah punya gambar approved, equipment sudah dikirim,

Constraint Register

C-003 A-3030 Access Rigging route ke Area A terhalang scaffold facade yang dipasang melintang di loadi

C-006 A-3030 Manpower Crew instalasi elektrikl dan crew rigging sudah mobilisasi untuk Area A. Elec

Constraints

Akses Apakah crew dan alat bisa benar-benar mencapai area kerja? Jalur rigging bersih, izin lifting, rua

Manpower Apakah ada crew yang kompeten lengkap dengan alatnya? Crew instalasi electrical dan crew riggin

Decision Log

D-001 2030-04-05 Jangan release A-3030 untuk rigging sampai access constraint C-003 dipastikan clear. Se

Keputusan: Jangan release A-3030 untuk rigging sampai access constraint C-003 dipastikan clear. Selama menungg

Electrical Equipment Installation - Area A

Access NOT READY C-003 Rigging route ke Area A terhalang scaffold facade yang dipasang melintang di

Manpower Ready C-006 Crew instalasi elektrikl dan crew rigging sudah mobilisasi untuk Area A.

Issue Loa

type: project-view · domain: project-alpha

Electrical Equipment Installation - Area A

Apa yang Membuatnya Bisa Dimulai — Readiness Check

Kesimpulan: NOT READY — 4 dari 5 prerequisite yang tercatat sudah ready.

Prerequisite	Kondisi	Constraint	Bukti / Deskripsi
Drawing	Ready	C-004	Shop drawing LV switchboard dan UPS sudah approved (A-1020).
Material	Ready	C-005	LV switchboard dan UPS sudah delivery dan lolos receiving inspection (A-2030) termasuk penggantian pintu panel UPS yang rusak.
Access	NOT READY	C-003	Rigging route ke Area A terhalang scaffold facade yang dipasang melintang di loading bay; lifting permit LP-07 untuk rigging switchboard dan UPS masih pending.
Predecessor	Ready	C-007	Finishing ruangan (A-3010) dan cable containment (A-3020) di Area A sudah selesai.
Manpower	Ready	C-006	Crew instalasi elektrikl dan crew rigging sudah mobilisasi untuk Area A.
Inspection	Belum ada catatan	—	—
Interface	Belum ada catatan	—	—

Predecessor

ID	Activity	Hubungan	Status
A-1020	Shop Drawing Approval — LV Switchboards & UPS	FS	Complete
A-2030	Delivery & Receiving Inspection — LV Switchboards & UPS	FS	Complete
A-3020	Cable Containment Installation — Area A	FS	Complete

Successor

ID	Activity	Hubungan	Total Float (hk)
A-3040	Busway & LV Cable Pulling — Area A to Data Hall 1	SS+6	0 (critical)

BACKLINKS · LINKED MENTIONS 19

Site Walk - Week 14

Beranda Pengetahuan Planning

Constraints

Critical Path

Dasar-Dasar Planning

Definisi Activity

Construction Completion

Sistem Elektrikal

Pengukuran Progress

Area A - LV Electrical Room

Constraint Register

Decision Log

Reproduksi cadangan dari file vault demo — boleh diganti screenshot asli saat rehearsal.

YANG SAYA KATAKAN


Enam bulan lagi saya lupa di mana. Cukup cari 'rigging' — semua konteksnya kembali dalam satu layar.

KALAU LIVE GAGAL

Ctrl + Shift + F, ketik rigging, Enter.

Graph view (opsional)

- Beranda
- Planning & Scheduling
- Data Center
- Project Controls
- Project Alpha (fiktif)
- Lessons Learned
- AI Workspace

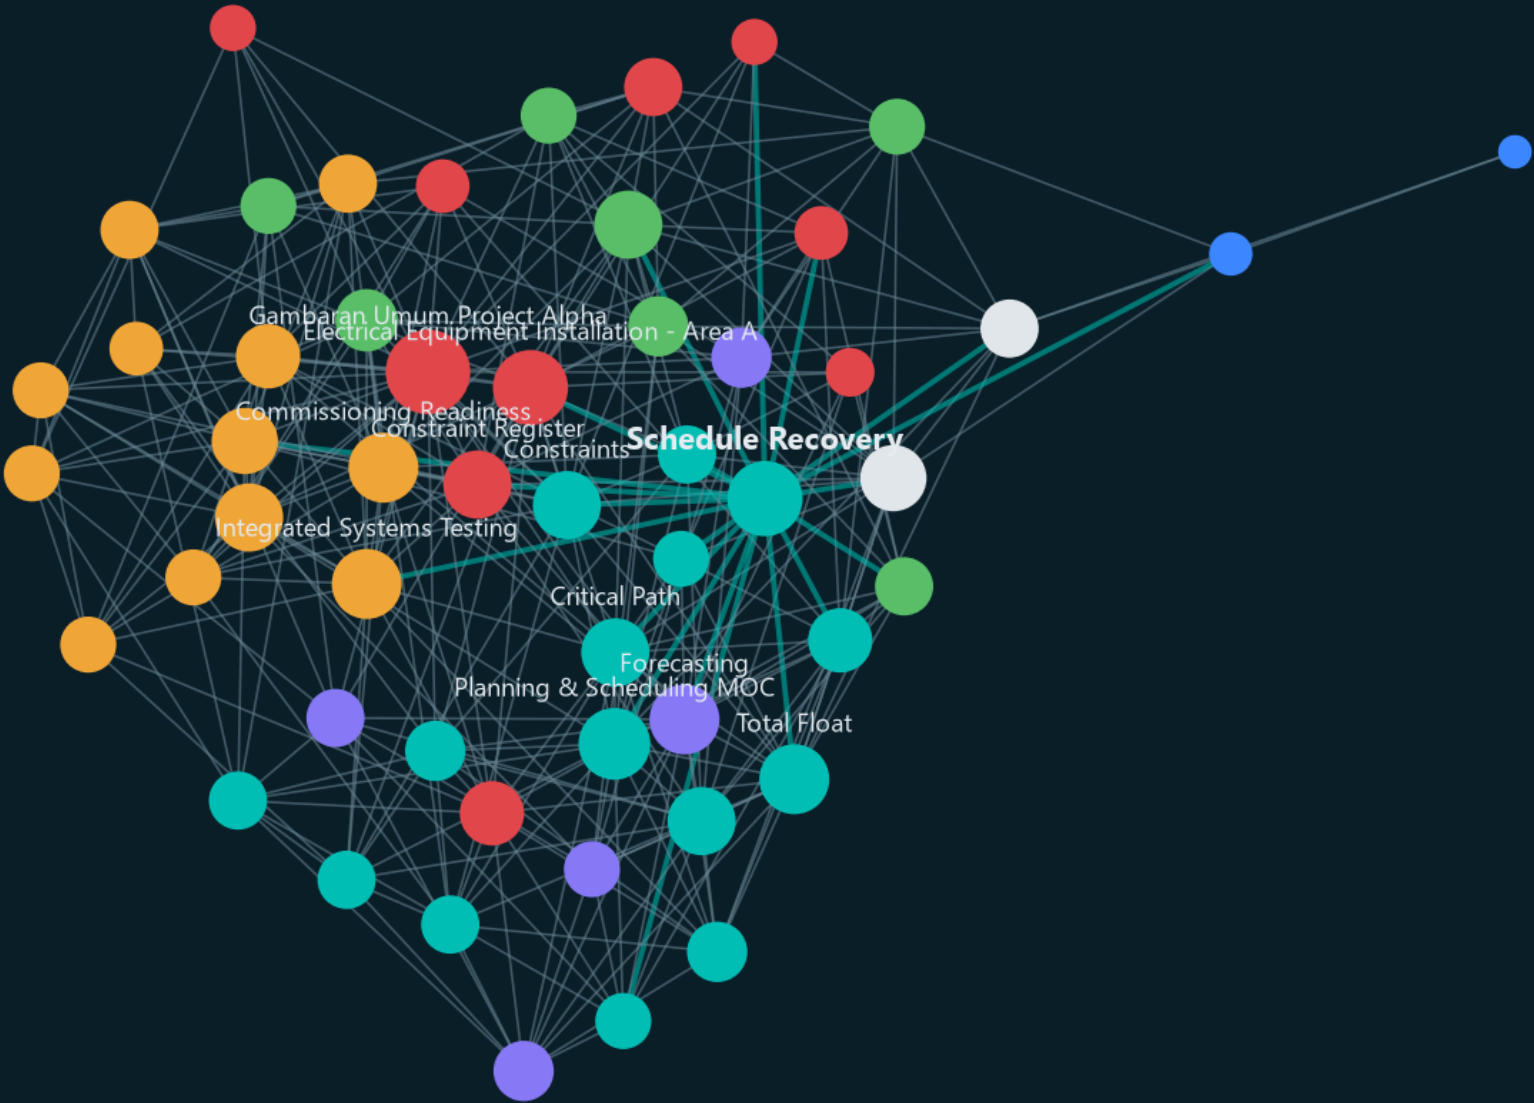

YANG SAYA KATAKAN

Kalau semakin banyak yang di-capture dan di-connect, bentuknya kurang lebih seperti ini. Tapi graph bukan tujuan — tujuannya menemukan konteks lagi.

KALAU LIVE GAGAL

Tunggu dua detik, atau tampilkan gambar graph di Offline-Demo.pdf.

DEMO LANGSUNG

Demo 2 — Obsidian + Claude

Prompt, note yang dibaca, dan balasan di chat

PROMPT

Dari data Project Alpha di vault saya: activity mana di critical path yang masih punya constraint open? Tampilkan Activity ID, constraint, owner, tanggal dibutuhkan, dan decision terkait. Simpan sebagai note memakai Template Review Critical Path.

- NOTE SUMBER (sesuai aturan template)
- 07 Template/Template Review Critical Path
 - 04 Project Alpha/Weekly Planning - Week 14
 - 04 Project Alpha/Constraint Register
 - 04 Project Alpha/Decision Log
 - 04 Project Alpha/Project Alpha Schedule

IZIN

Claude minta izin membuat file baru di 08 AI Output/ → Allow.

FILE

08 AI Output/Review Critical Path - 2030-04-08.md

BALASAN DI CHAT

Tersimpan: 08 AI Output/Review Critical Path - 2030-04-08.md

Ringkasan: ada 5 constraint open di critical path (data date 2030-04-08, dari Project Alpha — fiktif); yang paling mendesak adalah C-003 pada A-3030 (Access, owner Main Contractor Site Manager, dibutuhkan 2030-04-08, terkait D-001 dan D-002).

YANG SAYA KATAKAN

Hasilnya bukan pendapat AI, tapi data yang bisa dicek. Pertanyaan yang sama, dua kali dijalankan, hasilnya sama persis.

KALAU LIVE GAGAL

Tunjukkan halaman berikutnya: isi note hasil, baris per baris.

Review Critical Path — Data Date 2030-04-08

Draft AI — belum direview (reviewed: false) · Constraint open di critical path: 5 · Paling mendesak: C-003 · A-3030 · dibutuhkan 2030-04-08

#	Activity	Nama Activity	Constraint	Kategori	Owner	Dibutuhkan	Decision
1	A-3030	Electrical Equipment Installation — Area A (LV Switchboards & UPS)	C-003	Access	Main Contractor Site Manager	2030-04-08	D-001, D-002
2	A-3040	Busway & LV Cable Pulling — Area A to Data Hall 1	C-008	Manpower	Electrical Subcontractor	2030-04-15	D-004
3	A-4010	Pre-Energization Inspection & IR Testing — LV Switchboards (L2)	C-009	Inspection	Project Planner	2030-05-06	D-003
4	A-4020	Permanent Power Energization — LV Switchboards	C-010	Interface	Utility Coordinator	2030-05-23	—
5	A-5050	Integrated Systems Testing (L5) — Data Hall 1	C-014	Interface	Commissioning Agent	2030-05-25	—

Sumber: [[Constraint Register]] · [[Decision Log]] · [[Project Alpha Schedule]] · [[Weekly Planning - Week 14]]
