

LINKEDIN LIVE · PROJECT MANAGEMENT PRODIGY

Behind the Scenes of Data Center Project

Mastering Control, Management, and Continuous Monitoring from Ground to Cloud

Jumat, 18 September 2026 · 20.00 WIB

DIBAWAKAN OLEH





Masron Hutabalian



Abdul Kausar

SCHEDULE

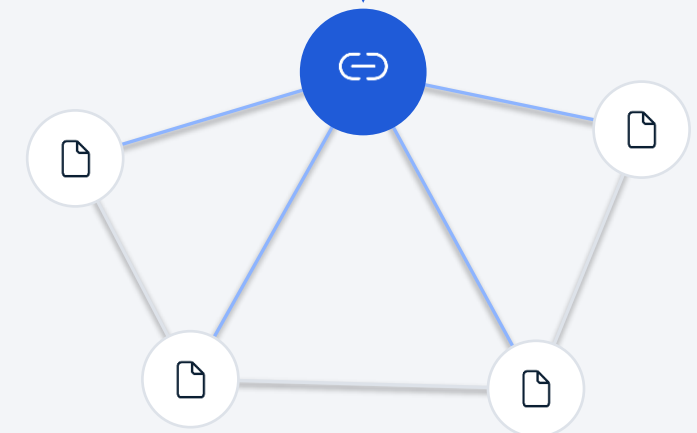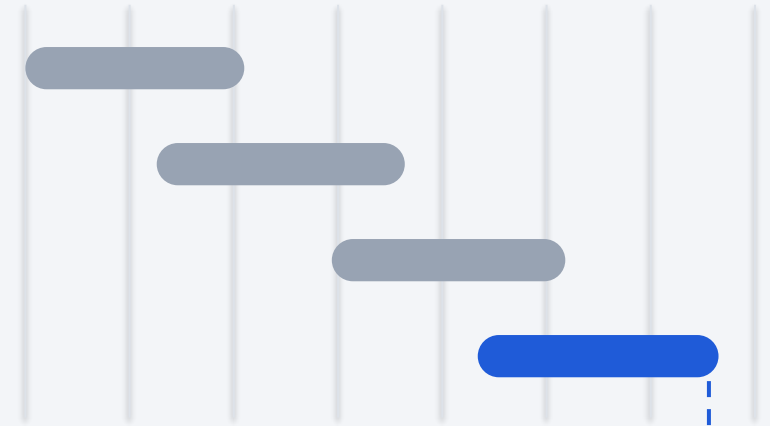

KNOWLEDGE

Satu jam, tiga bagian



±20 menit

BAGIAN 1

Proyek data center dari
ground sampai cloud

 Masron Hutabalian



±25 menit

BAGIAN 2

Informasi & knowledge di
balik control — Obsidian +
AI

 Abdul Kausar



±15 menit

BAGIAN 3

Tanya jawab bersama

 Masron & Abdul

Satu jam, tiga bagian



±20 menit

BAGIAN 1

Proyek data center dari
ground sampai cloud

 Masron Hutabalian



±25 menit

BAGIAN 2

Informasi & knowledge di
balik control — Obsidian +
AI

 Abdul Kausar



±15 menit

BAGIAN 3

Tanya jawab bersama

 Masron & Abdul



KERAHASIAAN

Sesi ini publik. Semua project, activity, tanggal, quantity dan data yang ditampilkan adalah simulasi.


Dari luar, data center hanya terlihat sebagai sebuah bangunan



GROUND

*Dinding, atap dan pagar. Yang tidak terlihat:
perjalanan panjang sampai layanan digital
bisa berjalan di dalamnya.*

Dari ground sampai cloud, perjalanannya panjang

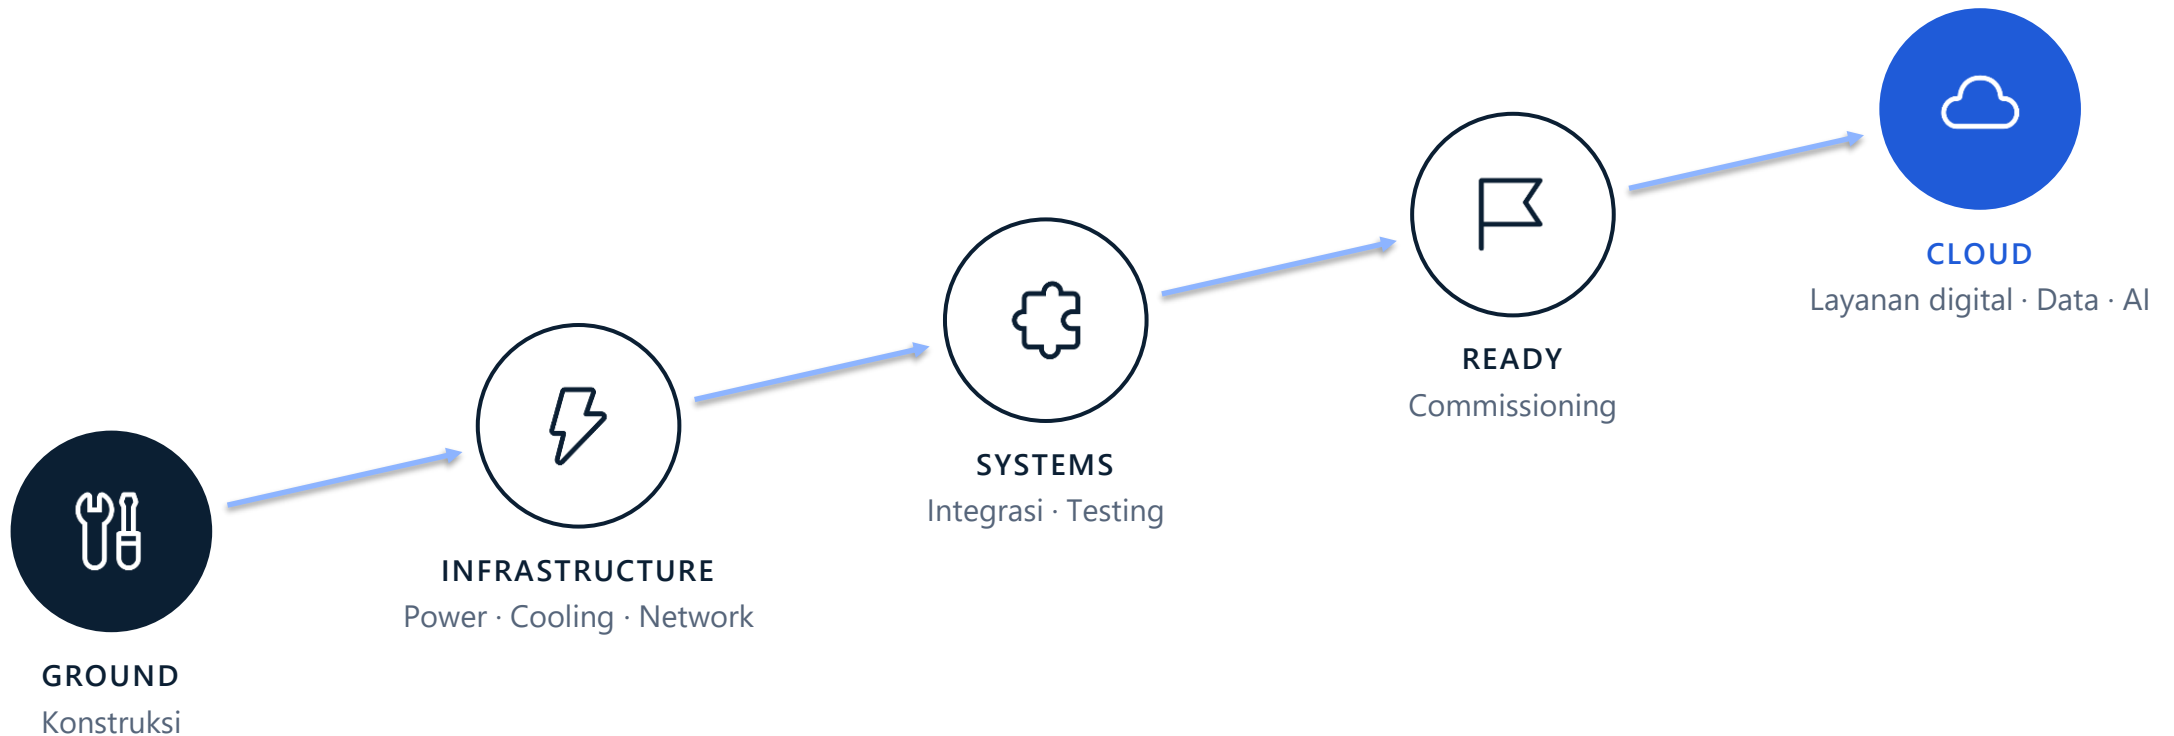

GROUND


Yang kita bangun lebih dari sekadar gedung



Data center

Gedung yang menjaga server tetap menyala
tanpa henti

Dibedah: enam system bertemu di IT infrastructure

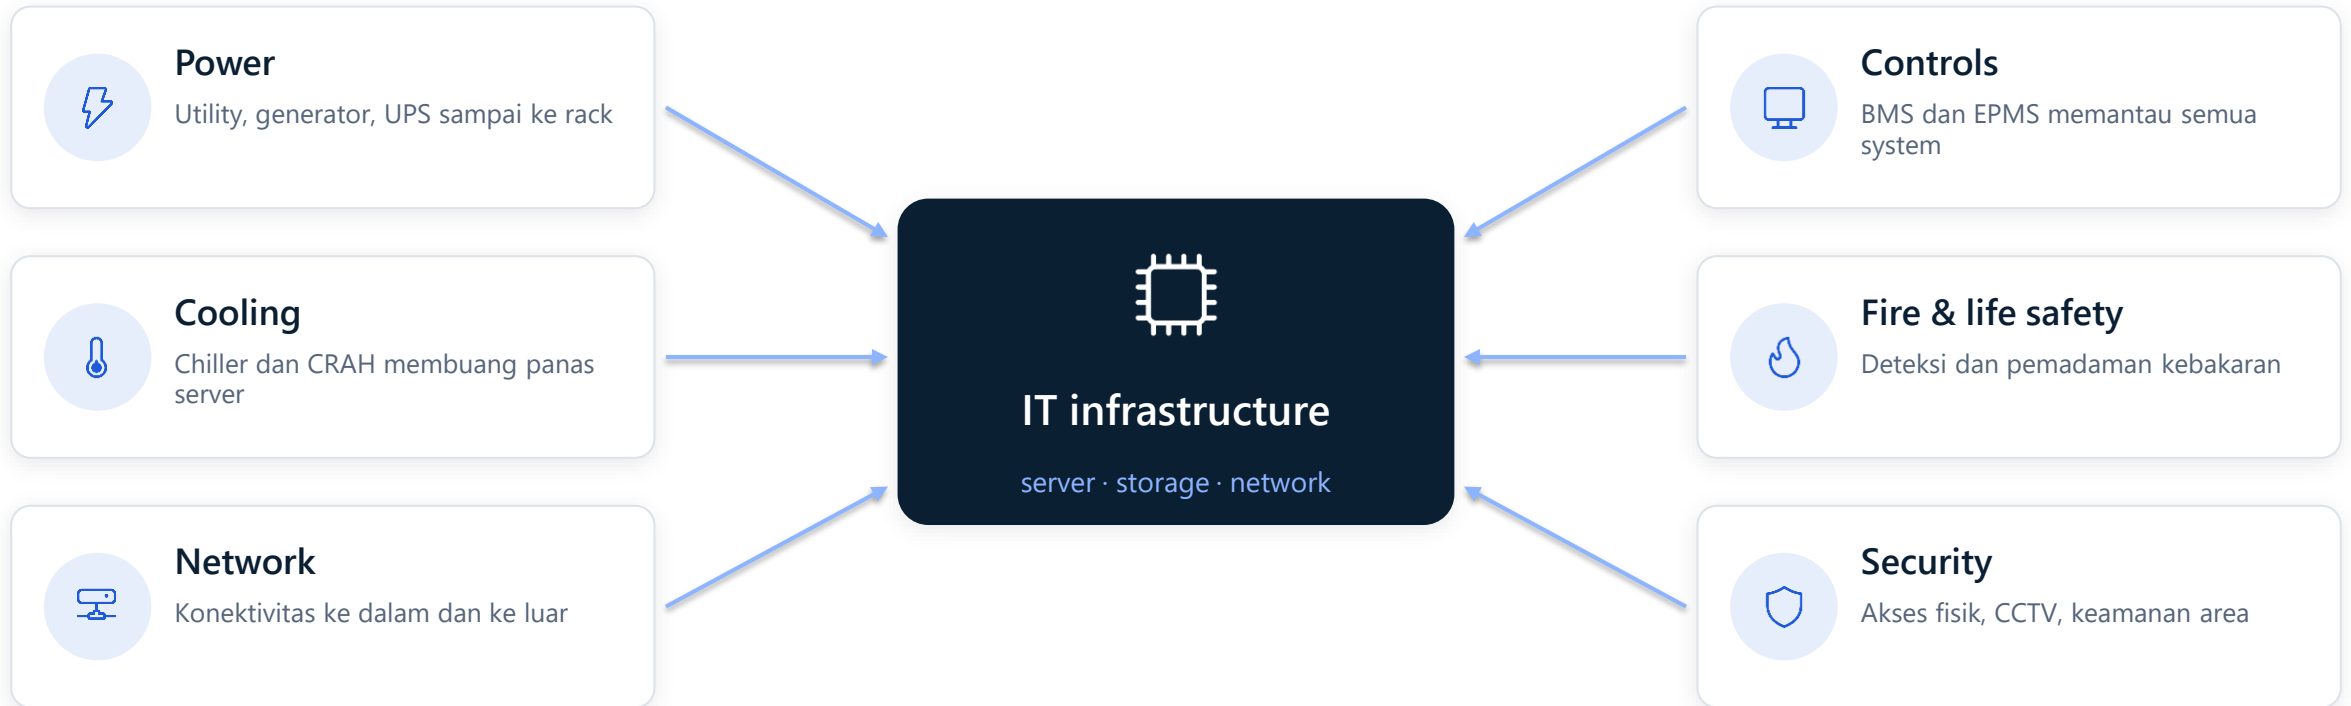

Data center bukan satu sistem. Data center adalah ekosistem sistem yang saling terhubung.

Ambil satu equipment saja



Equipment

misalnya UPS atau switchboard


Satu equipment. Kelihatannya sederhana.

Kompleksitas proyek data center ada di interface



Tantangannya bukan hanya banyaknya pekerjaan, tapi banyaknya interface.

Project control adalah sebuah loop, bukan sebuah laporan

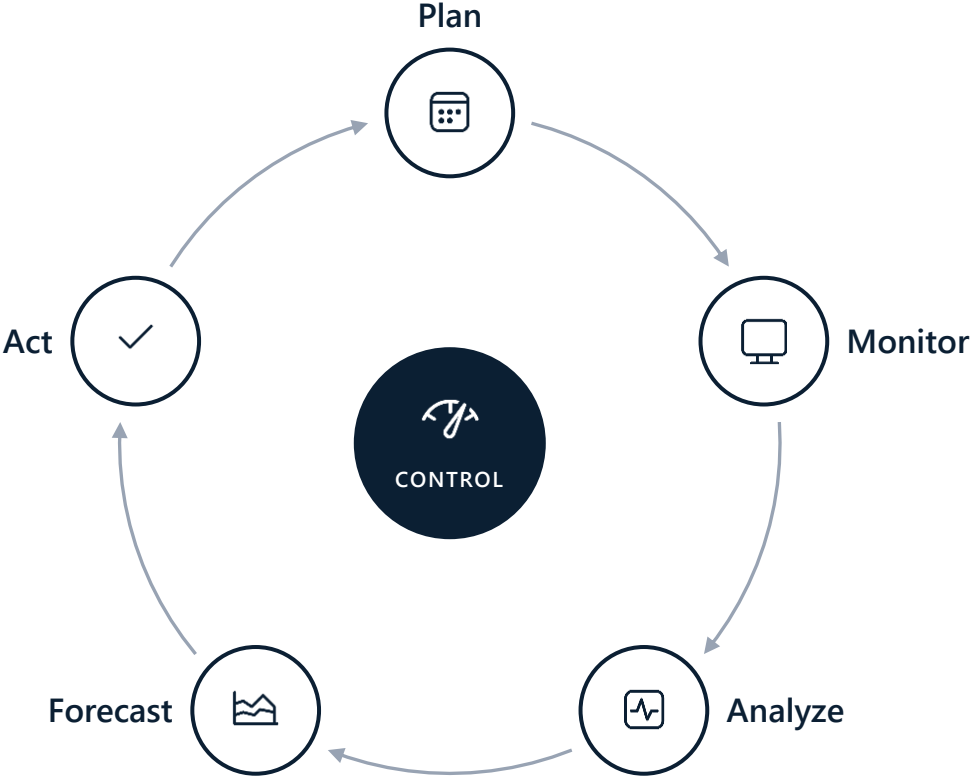


PERTANYAAN DI SETIAP PUTARAN

Plan	<i>Apa yang seharusnya terjadi?</i>
Monitor	<i>Apa yang sedang terjadi?</i>
Analyze	<i>Kenapa berbeda?</i>
Forecast	<i>Apa yang akan terjadi berikutnya?</i>
Act	<i>Apa yang harus kita lakukan sekarang?</i>

ALAT YANG MEMBANTU


- Primavera P6
- Progress update
- Lookahead
- Constraint register
- Forecasting
- Rapat koordinasi

Proyek data center bergerak dari engineering sampai handover



💡 Setiap transisi ditentukan oleh bukti, bukan oleh tanggal.

READY berarti sudah terbukti bekerja, bukan hanya terpasang



L1

Factory witness test

FAT equipment utama di pabrik sebelum dikirim

L2

Verifikasi instalasi

Cek instalasi, IR test, pressure test, point-to-point

L3

Start-up

Start-up per equipment, energization atau running pertama

L4

System testing

Tiap system dites sendiri, misalnya load bank generator dan UPS

L5

Integrated Systems Testing

Semua system dites bersama dengan beban dan skenario kegagalan


Penamaan L1–L5 berbeda antar organisasi — selalu cek commissioning plan proyek.

Ready for Service

Monitoring tidak berhenti saat konstruksi selesai



Satu activity di schedule: satu bar, dua tanggal

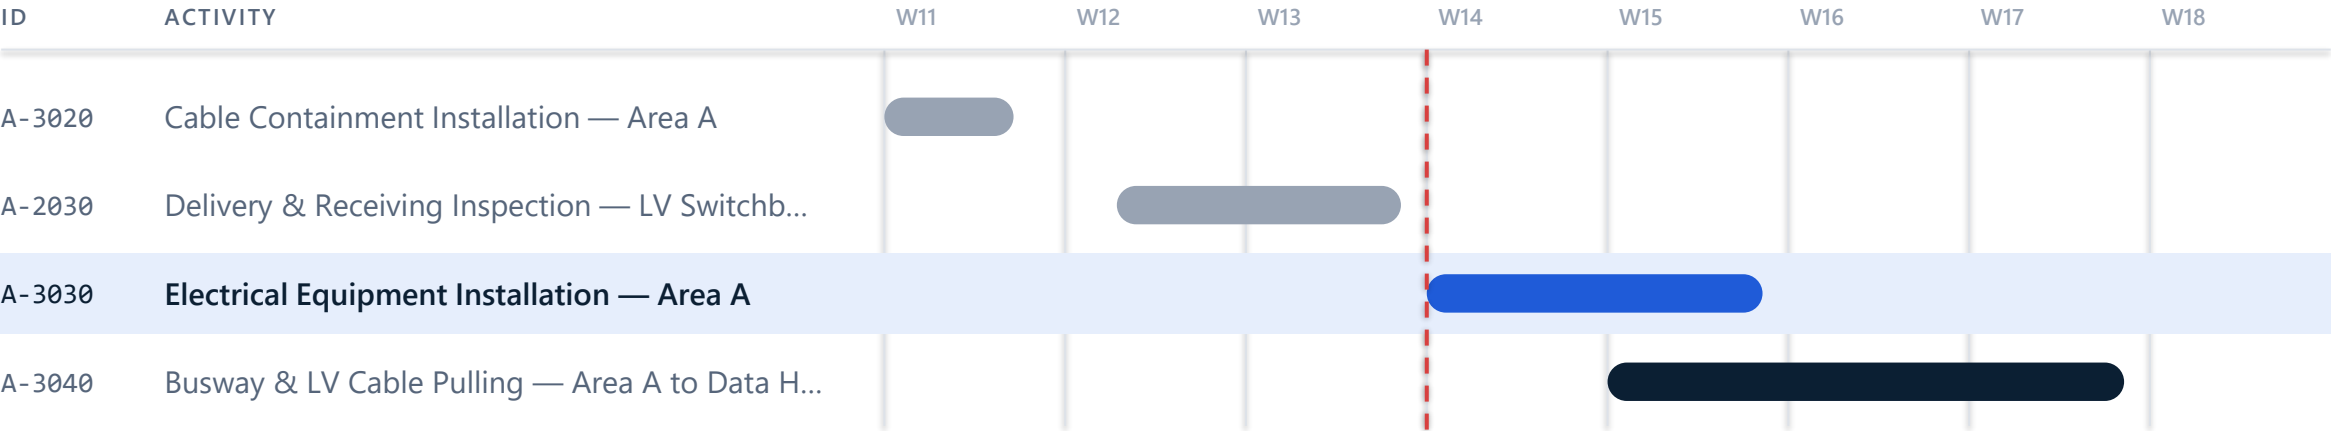


DATA DATE




Tanggal start sudah tiba. Apakah pekerjaan bisa dimulai?

Di balik satu bar, banyak hal yang harus siap

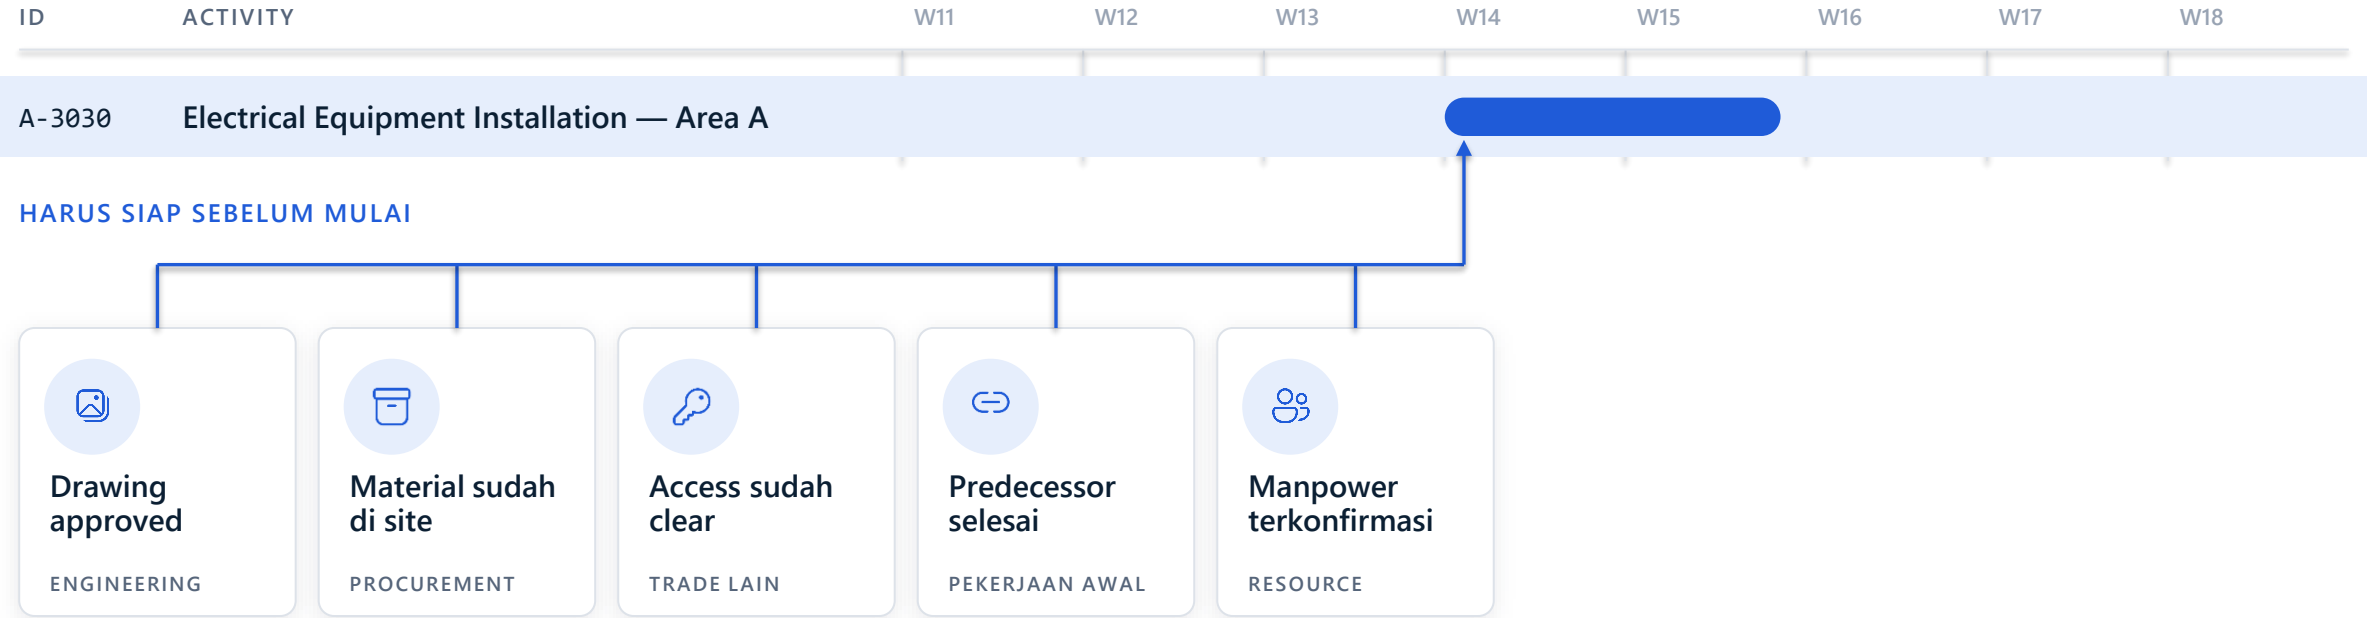


Satu activity, banyak realita

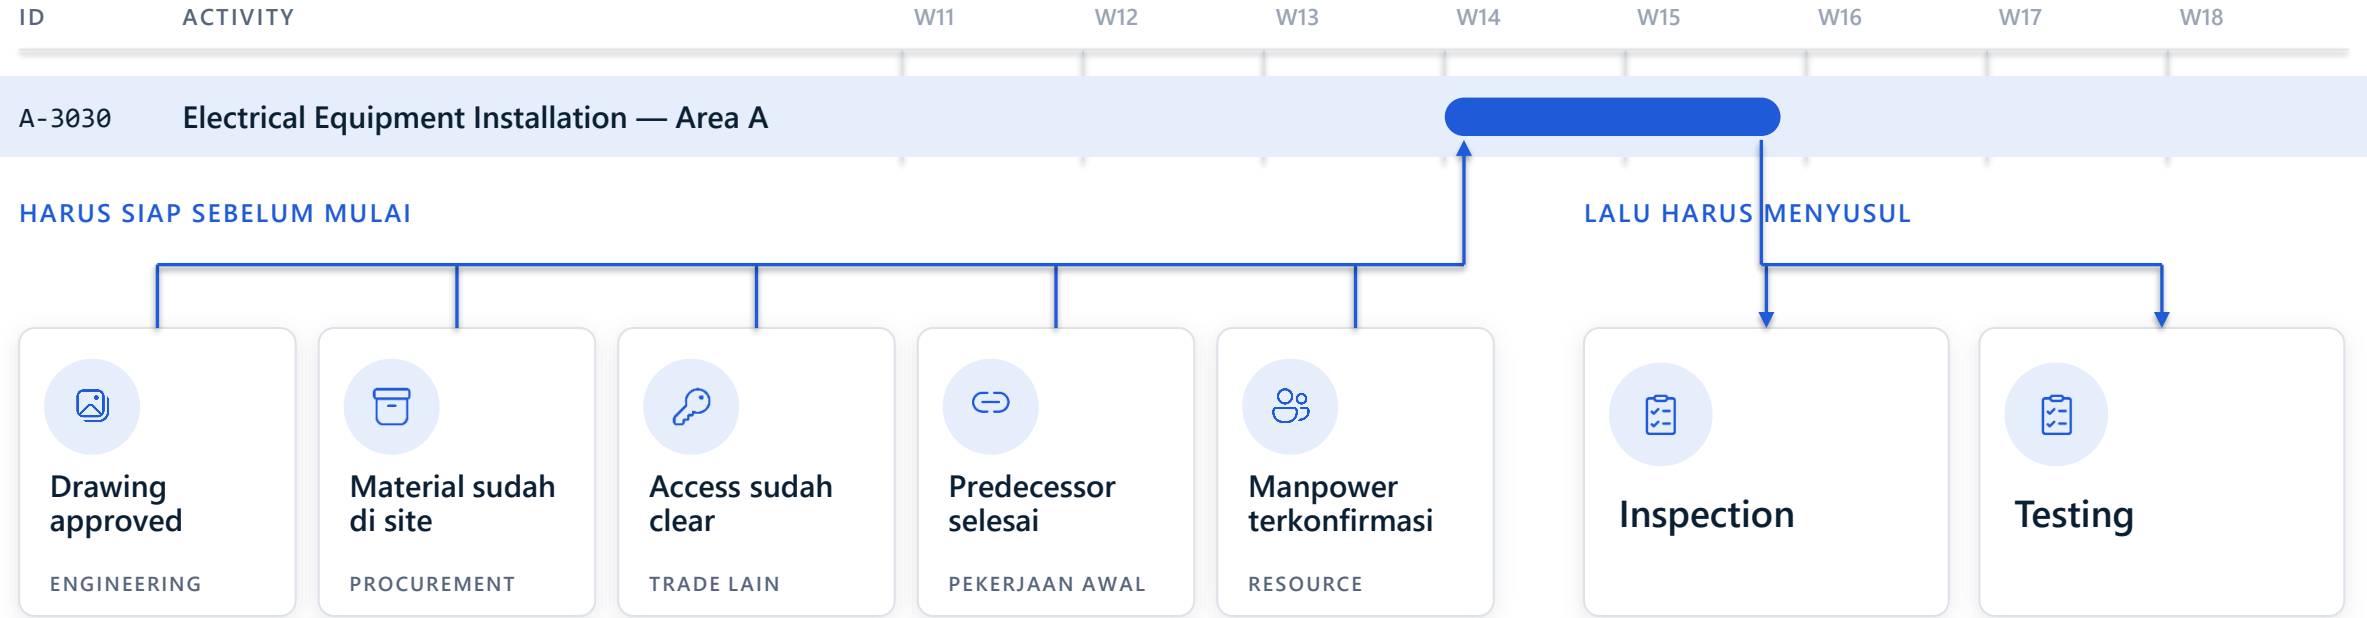

💡 **Schedule menunjukkan kapan. Project control bertanya apakah pekerjaan itu benar-benar bisa terjadi.**

One condition that isn't ready can stop the whole activity

KONDISI	PIC	STATUS
 Drawing C-004 · Shop drawing LV switchboard dan UPS sudah a...	Design Consultant	✓ Ready
 Material C-005 · LV switchboard dan UPS sudah delivery dan lol...	Procurement Lead	✓ Ready
 Manpower C-006 · Crew instalasi elektrikl dan crew rigging sudah...	Electrical Subcontractor	✓ Ready
 Predecessor C-007 · Finishing ruangan (A-3010) dan cable containm...	Main Contractor Site Manager	✓ Ready
 Access C-003 · Rigging route ke Area A terhalang scaffold fac...	Main Contractor Site Manager	Belum ready

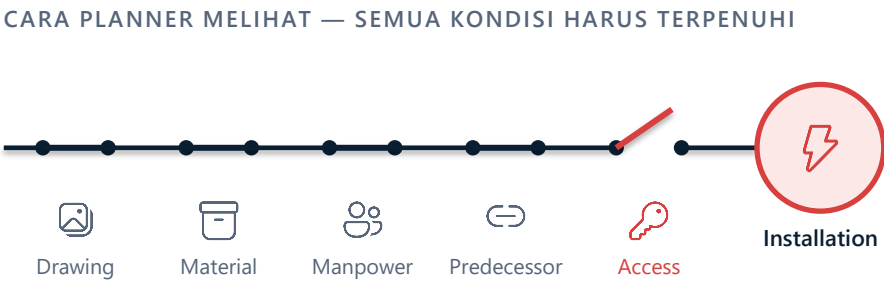

Belum ready Access menjadi blocker

💡 Readiness itu logika AND, bukan rata-rata: 4 dari 5 ready tetap bisa berarti belum ready.

Control butuh informasi.

Control, management dan monitoring semuanya bergantung pada informasi — dan pada pengalaman yang bisa ditemukan lagi saat dibutuhkan.



Control



Management



Monitoring




Ground to Cloud



Informasi & knowledge di baliknya


The real challenge: finding the right information at the right time

DOKUMEN & SISTEM




Informasi itu ada di mana, ya?

PERCAKAPAN & INGATAN



Storing information is not the same as building knowledge

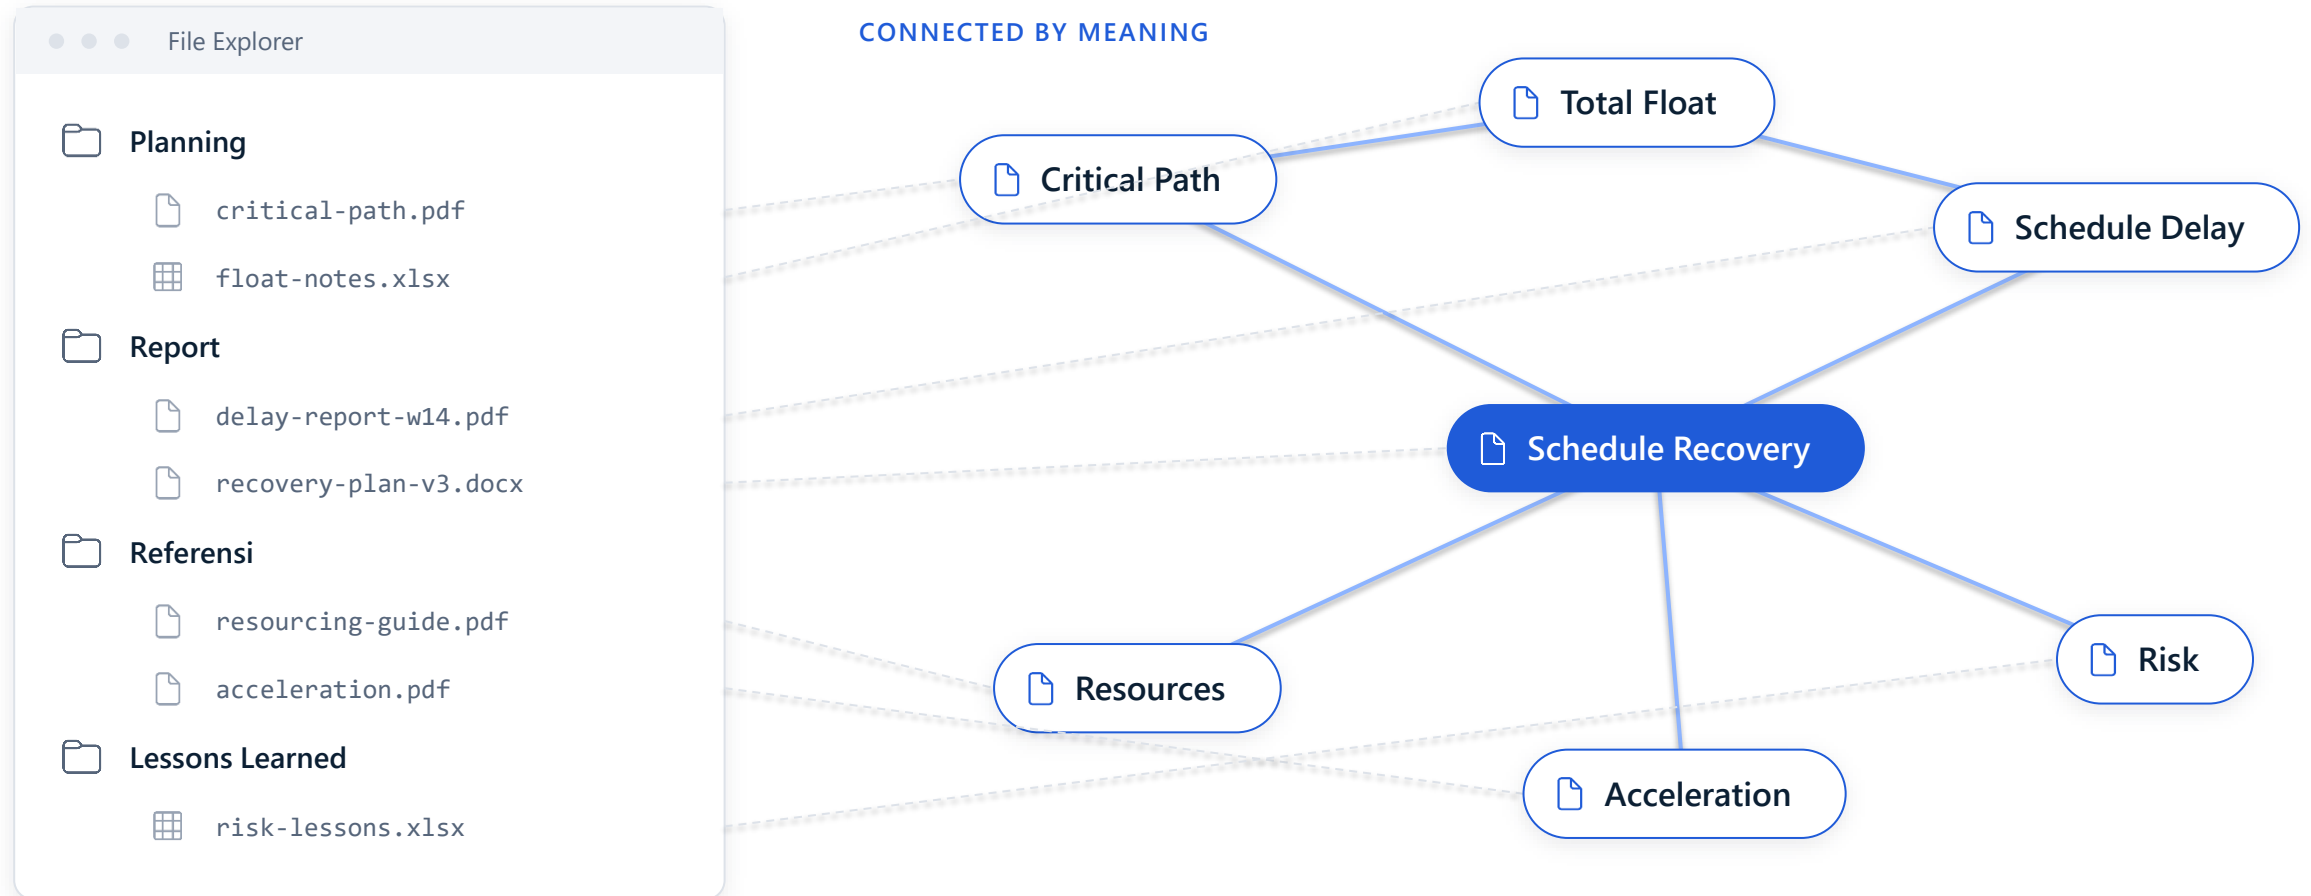

Obsidian: aplikasi catatan yang saling terhubung, tersimpan di laptop sendiri



APA ITU OBSIDIAN

Aplikasi catatan gratis. Setiap catatan adalah file teks biasa (Markdown) di dalam satu folder — disebut vault — di laptop Anda sendiri.

BIASANYA DIPAKAI UNTUK

-  Catatan kerja dan rapat
-  Knowledge base pribadi
-  Belajar dan riset
-  Menulis dan merencanakan

KENAPA MENARIK

-  Catatan saling terhubung lewat link, backlinks dan graph
-  File milik sendiri — tetap bisa dibuka tanpa internet
-  File biasa, jadi bisa dibaca tools lain — termasuk AI
-  Gratis, termasuk untuk pemakaian kerja



DOWNLOAD GRATIS

obsidian.md/download

Windows · Mac · Linux · iOS · Android

Buka link download



Capture, organize, connect, retrieve: four simple steps



Planning-Knowledge-Demo-ID — Obsidian

FILE

00 Beranda

01 Planning & Scheduling

Schedule Recovery

02 Data Center

03 Project Controls

04 Project Alpha

05 Lessons Learned

01 PLANNING & SCHEDULING / SCHEDULE RECOVERY

Schedule Recovery

Schedule recovery adalah rencana yang disengaja dan berbasis bukti untuk merebut kembali waktu yang hilang di critical path dan near-critical path, dengan mengubah waktu atau sumber daya untuk sisa pekerjaan — tanpa menciptakan risiko yang lebih besar dari delay itu sendiri.

KONSEP TERKAIT

- Critical Path** — recovery hanya ada hasilnya di driving path
- Total Float** — recovery bertujuan memulihkan float ke milestone penting
- Schedule Delay** — alasan recovery plan dibuat
- Acceleration** — salah satu cara menjalankan recovery, biasanya mahal
- Constraints** — menyelesaikan readiness constraint lebih awal sering jadi recovery yan...

LOCAL GRAPH

```
graph TD; A(( )) --- B((Critical Path)); A --- C((Total Float)); A --- D((Schedule Delay)); A --- E((Acceleration)); A --- F((Constraints));
```

This demo vault was prepared in advance. In real work, a vault grows from small habits

VAULT YANG AKAN ANDA LIHAT

±50

catatan, disiapkan khusus untuk sesi ini

- ✓ Project Alpha 100% fiktif — tidak ada data proyek nyata
- ✓ Draft dibantu AI, lalu saya review dan perbaiki sendiri
- ✓ Tujuannya menunjukkan polanya, bukan jumlah catatannya
- ✓ Masih eksperimen pribadi — bukan standar kerja atau rekomendasi resmi

DI PEKERJAAN NYATA



HARI 1

1 catatan

Satu temuan hari ini:
site walk, rapat, atau
issue di schedule



MINGGU 1

±10 catatan

Setiap kejadian penting
satu catatan pendek;
ketik [[untuk
menghubungkan



BULAN 1

±50 catatan

2–3 catatan per hari
kerja, plus 15 menit
seminggu untuk
merapikan



A vault isn't built in a day: one note, one link, every day.

LIVE DEMO

Let me show you

Vault demo 100% simulasi, dibuat khusus untuk sesi ini.



Klik satu langkah untuk membukanya di Obsidian



Alt + Tab untuk kembali ke slide

The graph isn't the goal. Finding the context again is.

1



CATAT

Catat temuan site walk

Satu klik menulis temuan hari ini sebagai note — langsung terhubung ke activity.

Buka



2



HUBUNGKAN

Lihat dari sisi activity

Activity menampilkan readiness check — dan semua note yang menyebutnya.

Buka



3



PAKAI ULANG

Pakai lagi lesson yang ada

Lesson yang ditulis sekali — 4 dari 5 ready itu belum ready — berlaku di setiap project.

Buka



4



TEMUKAN

Temukan lagi dengan satu kata

Berbulan-bulan kemudian, satu pencarian memunculkan meeting, activity, lesson dan note hari ini.

Buka



5



LIHAT

Lihat hubungannya

Opsional — graph view menunjukkan bagaimana note saling terhubung.

Ctrl + G

AI finds the notes, connects them, and shows its sources

🔍 "Activity mana di critical path yang masih punya constraint open?"

1 🔍 Find

note yang relevan

- 📄 Constraint Register
- 📄 Decision Log
- 📄 Project Alpha Schedule
- 📄 Weekly Planning - Week 14
- 📄 Template Review Critical Path
- 📄 AGENTS (aturan vault)

➔ 2 🔗 Connect

isi note yang saling terkait



➔ 3 📄 Cite

dari mana setiap poin berasal

Answer + sources

- [[Constraint Register]]
- [[Project Alpha Schedule]]
- [[Decision Log]]

LIVE DEMO

Obsidian + Claude

Claude Desktop · tab Code · folder vault demo · model Sonnet · mode Ask permissions

Buka Claude



Salin prompt



Salin prompt membuka halaman Demo Launcher; klik Salin prompt, lalu paste di Claude.

PROMPT · REVIEW CRITICAL PATH

Dari data Project Alpha di vault saya: activity mana di critical path yang masih punya constraint open? Tampilkan Activity ID, constraint, owner, tanggal dibutuhkan, dan decision terkait. Simpan sebagai note memakai Template Review Critical Path.



1



Perhatikan: note saya dibuka dulu

2




Izinkan Claude menyimpan note baru


3



Buka note hasilnya di Obsidian

The value isn't the table. It's knowing where every row came from.

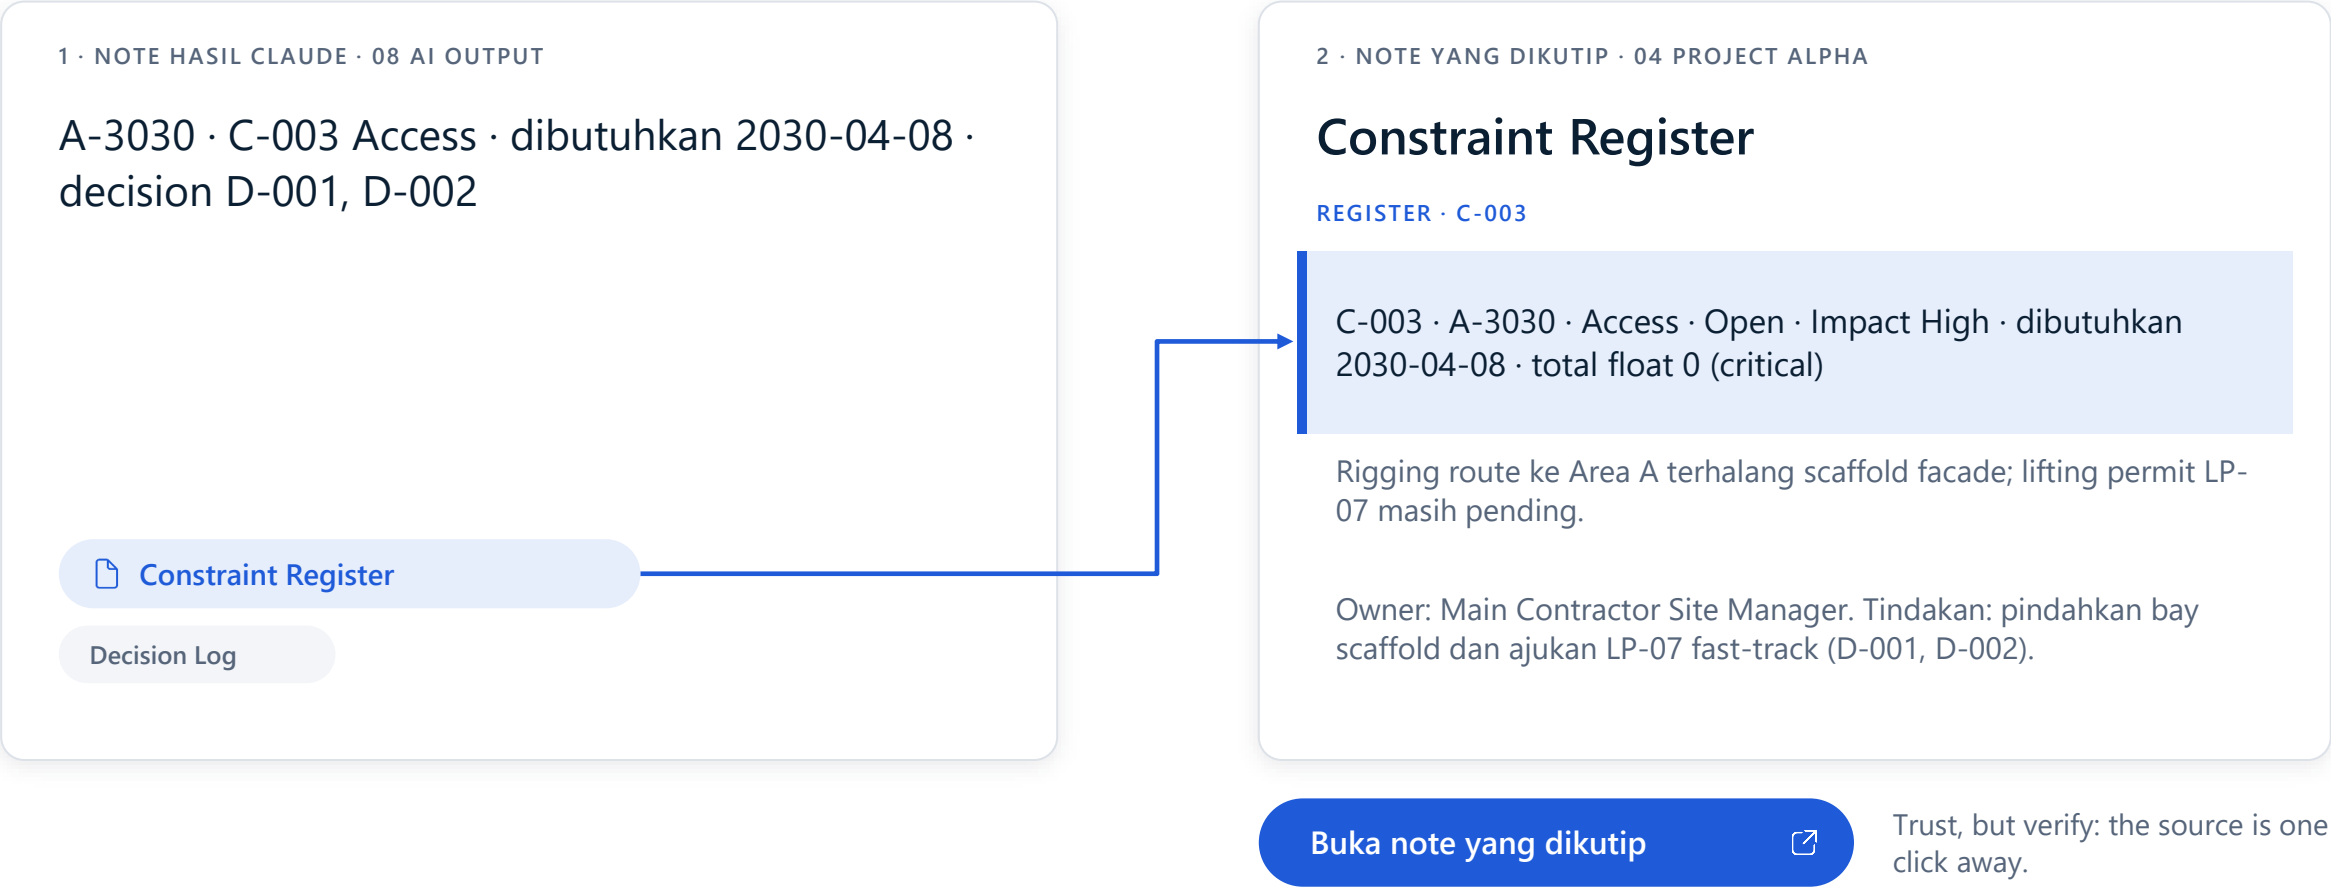

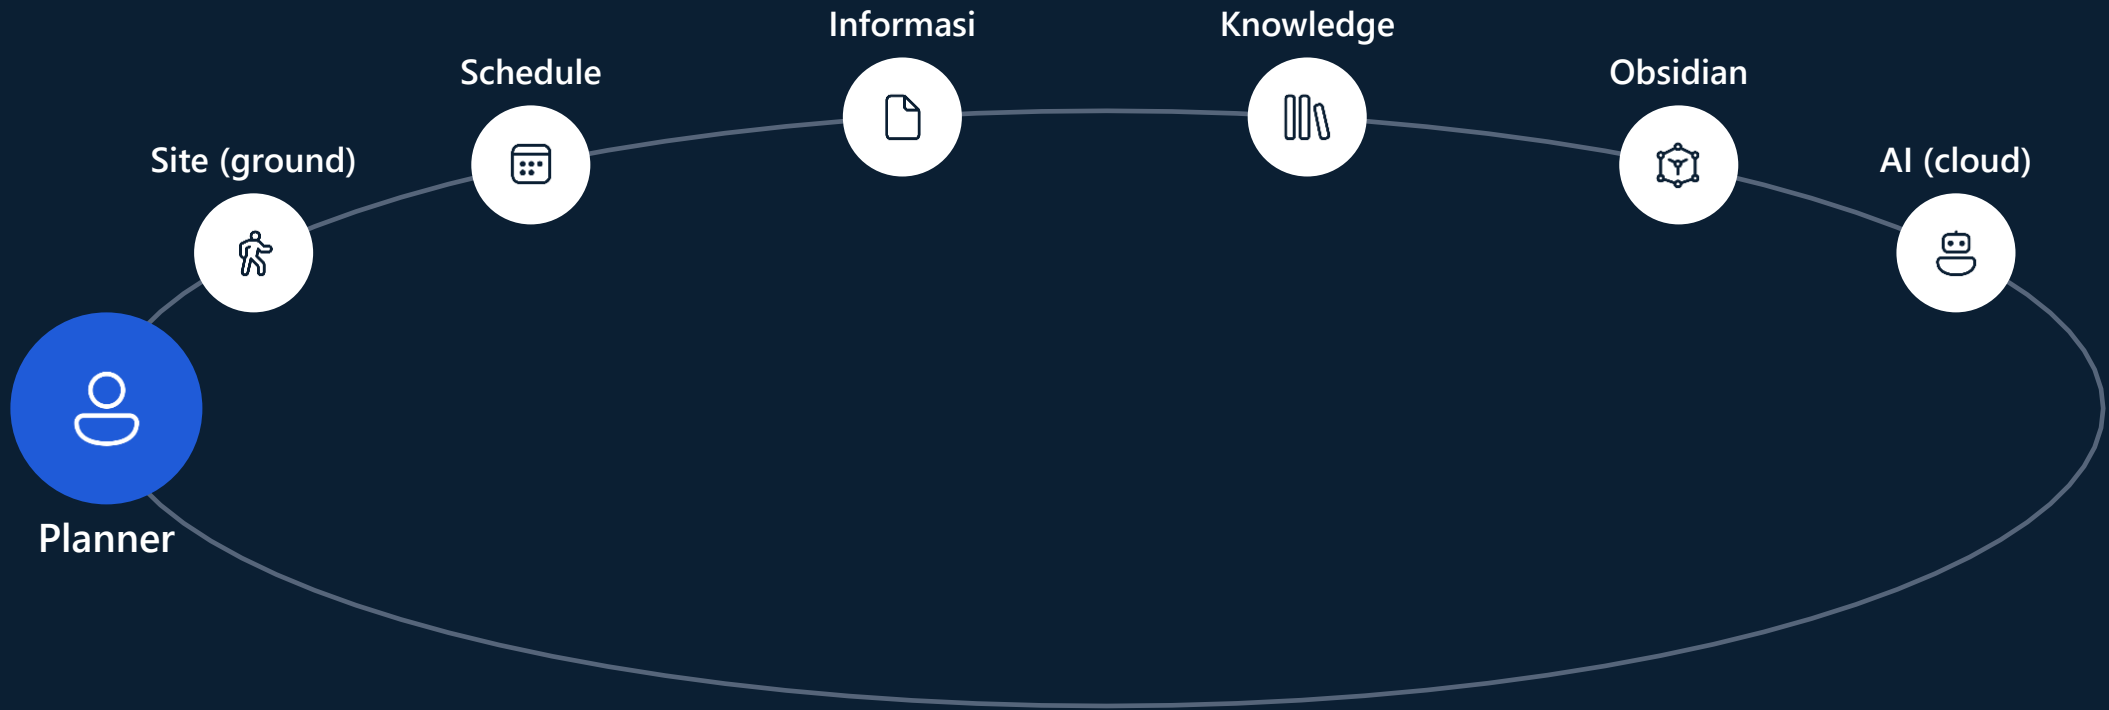

From ground to cloud, the planner stays at the center.
Technology makes experience reusable.



Understand the work.



Capture what you learn.



Make it reusable.

Tidak semua orang butuh Obsidian. Tidak semua orang butuh AI.

Apa yang saya pelajari dari pekerjaan hari ini
— dan apakah masih bisa saya pakai setahun
lagi?

Terima kasih.

Discussion



Semua project, activity, tanggal, quantity dan data yang ditampilkan hari ini adalah simulasi.
